

PERSPECTIVES KAMERUN e.V.

Sauberes Trinkwasser für Malende

Abschlussberichte

Das Projekt haben wir anfang November 2011 vorort in Malende ein Dorf zirka 7 km entfernt von Kumba in Süd-Western Region von Kamerun gestartet. Geld wurde bei die zuständige Vereinsmitglieder Vorort direkt an das Wasserkomitee ins Dorf übergeben. Es war das erste große Projekt dieser Art für das Ganze Dorf in Kamerun. Das Projekt konnte gerade am 25 April 2012 erfolgreich abgeschlossen und übergeben werden ans Dorf. Der Bau der Wasserleitung wurde unter Aufsicht von PERSPECTIVES KAMERUN e. V. mitgliedern und das Wasserkomitee der Dorfgemeinschaft durchgeführt.

Seit ende April dieses Jahres beziehen die rund 1.500 Bewohner in Malende und Nachbarn Dorfer sieben Kilometer von Kumba im Südwesten Region Kameruns entfernt gelegen, ihr Trinkwasser aus Wasserhahn von Wasserleitung von einem Tank am Ortsrand. So müssen sie nicht mehr, mehr als 2,5 bis 3,5 Kilometer zur Wasserquelle laufen.

Um das Projekt zu verwirklichen haben wir mit 16.424,50 Euro gerechnet. Wir haben bis zum Abschluss 17.626,10 Euro gebraucht. Mehrausgaben von 1.201,60 Euro. Mit Hilfe von BINGO-Fördermitteln in Höhe von rund 10.000 Euro (Teilbetrag von 5.000 Euro haben wir in Oktober 2011 erhalten) wurde von der Wasserquelle zirka 2,5Km von Dorf entfernt eine Wasserleitung bis nach Malende verlegt. Es standen drei Quellen zur Auswahl und wir haben die Quelle gewählt, die das ganze Jahr so viel Wasser führt, dass es ohne weitere technische Hilfsmittel durch das natürliche Gefälle bis nach Malende fließt. Eine saubere Wasserqualität gewährleistet ein Filterbecken aus Kies, Sand und Holzkohle, durch das, das Wasser in einen großen Sammelntank gelangt, bevor es bis in das Dorf Malende fließt, gepumpt durch Druckröhre.

Die Menschen sind zufrieden, dass sie nur noch weniger als zirka 400 Meter je nach Standort laufen müssen, um sich ihr Wasser zu holen direkt von Wasserhahn. Über das Wasserkomitee waren die Planungen des Projektes im Dorf verankert und alle Arbeiten wurden von den Dorfbewohnern ausgeführt durch Gemeindearbeit koordiniert von Ausgebildete Fachpersonell von CHENWI WATER WORKS CAMEROON. In April 2012 ist ein Vereinsmitglied von Kiel nach Kamerun vereist und in das Dorf, um den aktuellen Stand der Wasserversorgung zu prüfen und weitere Schritte mit dem Wasserkomitee zu besprechen, sowie das Projekt abzuschliessen. Mit der Dorfgemeinschaft haben wir Methode entwickelt für die Nachfinanzierung für Instandsetzung und eventuelle Ersatzteile.

Schwierigkeiten gab es am anfang 6 December 2011 als der Dorfs „Chief“ (Hauptling) „Chief Nghoh“ Verstab. Gemeindearbeit wurde beschränkt bis 6 Januar 2012 nach seiner Beerdigung. Es gab auch Schwierigkeiten bei Baumaterial Lieferung, es dauert immer etwas länger as vorgeplant von Bestellung bis Lieferung ins Dorf, manchmal müssen wir bis zu 2 Wochen warten bis geliefert wird. Es

entstand auch mehrkosten für Fachpersonell und Transport, dann kommt dazu beim Regen muss man auch abwarten. Das Projektsbauzeit dauert etwas länger als vorgeplant. Allgemein ist alles gut gelaufen, besondere die Engagement der Dorfbewohnern, jedes mal nach dem Glockenschlag für Gemeindearbeit waren sie Pünktlich da.

Das nächste Ziel ist, die Wasserversorgung in Dorfschule zu führen, um die Wege zum Wasserhahn nochmals zu verkürzen. Dazu soll in Notfall eine Solarpumpe installiert werden, die den Wassertransport auch bei Niedrigwasser bis in Dorfzentrum garantiert. Um die Wasserversorgung möglichst störungsfrei und kostengünstig zu gewährleisten, haben wir eine Solarpumpe ohne Akku gewählt, die eben nur tagsüber arbeiten wird.

Wir von der Verein PERSPECTIVES KAMERUN e.V. und die Bewohnern von das Dorf Malende sind sehr Dankbar für die Unterstützung erhalten von Lotterie BINGO! Fördermitteln und haben wir zusätzlich Hinweisplakat ins Dorf instalirt.



Plakatschild in Malende Dorf.



Am Wasserquelle



Wasserquelle



Wasserquelle Besichtigung



Wasserkomitee Versammlung.



Geldübergabe in Malende Dorf Komitee.



Abschlussgebet beim Versammlung



Versammlungsende



Besichtigungskomitee.



Wasserquelle gebaut




Wassertank konstruktion



Wassertankbau



Wassertankbau

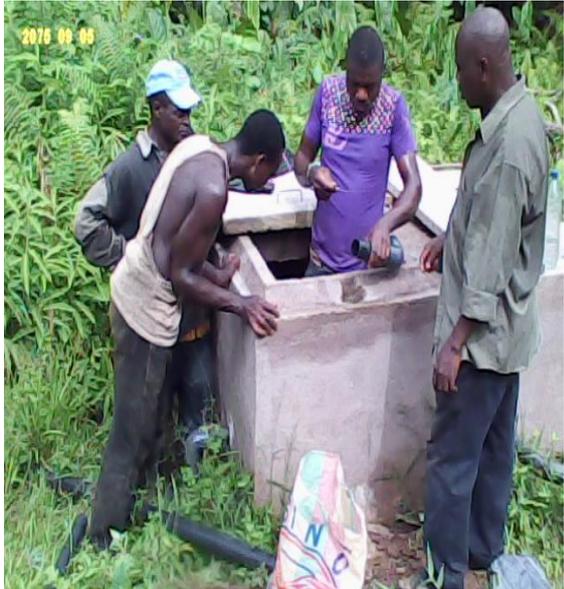

Wassertankbau



Wasserbecken mit Röhren.



Gemeindarbeit



Wassertank Nr.1



Röhren & Material Ankunft per Lkw



Abladen von Baumaterial.



Gemeindarbeit



Wasserhahn Montage



Gebaute Wasserquelle Nr.1



Gebaute Wasserquelle Nr.2



Projektabschluss 25 April 2012



Projektabschluss 25 April 2012

Projektabschlussbilder

Übergabe am 25 April 2012



Mehrbilder und Info in Website www.perspectives-kamerun.com
